

Resumen de gestión en Jira

Resumen ejecutivo de la gestión en Jira (proyecto PI, GameSage). Esta página condensa lo necesario para evaluar la gestión del proyecto sin recorrer cada página hija del bloque Jira. Para el detalle por incidencia (ADF, metadatos y subtareas), consulta [Epics del proyecto](#), [Histórico de sprints](#) y [Equipo, métricas y vista del backlog](#) (enlazados más abajo). Copia estática en PDF: \$10.

El backlog documentado acumula **558 incidencias**, el **100%** en estado *Finalizada*. El equipo planificó **440 Story Points** en 146 US/TASK repartidas en **17 sprints** y **8 epics**. La carga entre desarrolladores es equilibrada (~55% / ~45%). Los epics y sprints permanecen visibles en Jira como contenedores históricos; no representan trabajo pendiente operativo.

Campo	Valor
Instancia	g-team-d9bwba4i.atlassian.net
Proyecto	PI (Proyecto Intermodular) — producto GameSage
Fecha del informe	3 de junio de 2026
Incidencias analizadas	558 (US, TASK y subtareas)
Equipo	Álvaro Jiménez Muñoz · Rosario González Nortes
Exposición DAM	5 de junio de 2026 · 10:15–10:30 · orden 6 (Visión general)

1. Alcance y acceso

- **Proyecto Jira:** PI (Proyecto Intermodular), producto GameSage.
- **Tablero Scrum:** [Tablero PI](#) — iteraciones de 2 semanas.
- **Instancia:** <https://g-team-d9bwba4i.atlassian.net>
- **Volumen documentado:** 8 epics, 17 sprints, 146 US/TASK con sprint, 558 incidencias totales (US, TASK y subtareas).

Visibilidad en Jira vs. trabajo terminado

- Los **epics** y los **sprints** permanecen *abiertos* en Jira a propósito, para poder revisar el histórico con comodidad (backlog, tablero, filtros y documentación en Confluence).
- **Todo el trabajo está terminado:** los 8 epics están completados; las US, TASK y subtareas figuran en *Finalizada*.
- **Cierre de sprints:** cada sprint se considera finalizado en cuanto se supera su **fecha de fin** (aunque el sprint siga visible sin cerrarse manualmente en Jira).

2. Metodología de gestión

- Organización por **8 epics** de dominio (infraestructura, catálogo, identidad, web, móvil, UX, seguridad, plan de empresa).
- Trabajo planificado en **17 sprints** con objetivo por iteración; US y TASK con Story Points enteros y equipo *Desarrolladores*.
- Cada US/TASK descompuesta en **subtareas** con checklist en Jira (replicada en Confluence en el detalle por sprint).
- Convenciones: US con plantilla Como/quiero/para, criterios de aceptación, DoR y DoD; nomenclatura US-NN y TASK-NN.
- Epics y sprints *abiertos* en Jira solo para consulta del histórico; epics completados; US/TASK/subtareas en *Finalizada*; sprint cerrado al pasar su fecha de fin.

3. Estado global del backlog

Estado	Incidencias	%
Finalizada	558	100%
Total	558	100%

Por tipo de incidencia

Tipo	N	%
Subtarea	408	73.1%
Tarea	61	10.9%
Historia	89	16.0%

4. Reparto de trabajo por persona

Asignación de US, TASK, subtareas y Story Points (métricas sobre padres US/TASK para SP).

Métrica	Álvaro Jiménez	Rosario González	Total
User Stories	49 (55.1%)	40 (44.9%)	89
Tasks	36 (59.0%)	25 (41.0%)	61
Subtareas	223 (54.7%)	185 (45.3%)	408
Story Points	242 (55.0%)	198 (45.0%)	440

Reparto equilibrado entre ambos integrantes del equipo de desarrollo.

Carga por miembro (totales asignados)

Miembro	Asignadas	Finalizadas	Abiertas	% completado
Álvaro Jiménez	308	308	0	100%
Rosario González	250	250	0	100%

Asignadas = US + TASK + subtareas con asignado en Jira.

5. Epics del proyecto

Resumen de alcance por epic; descripción SMART y detalle en [Epics del proyecto](#).

Epic	Título	US/TASK	SP hijas	Estado epic
PI-226	EPIC - Prototipo UX	8	28	Tareas por hacer
PI-550	EPIC - INFRAESTRUCTURA, ARQUITECTURA Y DEVOPS	34	80	Tareas por hacer
PI-551	EPIC - GESTIÓN DE IDENTIDAD Y SEGURIDAD	6	20	Tareas por hacer
PI-552	EPIC - CATÁLOGO DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS	6	41	Tareas por hacer
PI-553	EPIC - EXPERIENCIA WEB Y E-COMMERCE	39	111	Tareas por hacer
PI-554	EPIC - DESARROLLO DE APLIACIÓN NATIVA MÓVIL	41	112	Tareas por hacer
PI-557	EPIC - SEGURIDAD TÉCNICA Y HARDENING	1	2	Tareas por hacer
PI-687	EPIC - IDEACIÓN Y PLAN DE EMPRESA	11	39	Tareas por hacer

6. Histórico de sprints

Iteraciones ejecutadas; detalle de cada US/TASK en [Histórico de sprints](#).

Sprint	Periodo	Objetivo (extracto)	US/TASK	SP
Sprint 1	2025-10-19 — 2025-11-01	Selección de la idea del proyecto y elaboración de la misma + Desarrollo de sket	5	16
Sprint 2	2025-11-02 — 2025-11-15	Desarrollo inicial de la estructura del backend en Node + pantallas iniciales de	11	42
Sprint 3	2025-11-16 — 2025-11-29	Terminar backend inicial en Node, listo para las pantallas de inicio, usuario y	17	71
Sprint 4	2025-11-30 — 2025-12-13	Progreso en el desarrollo de la aplicación en Kotlin, mejoras varias, desarrollo	13	38
Sprint 5	2025-12-14 — 2025-12-27	Finalización del plan de empresa + Avances en aplicación móvil + Informe de Powe	10	38
Sprint 6	2025-12-28 — 2026-01-10	Responsividad en móviles y funciones de administradoras en la web integradas + F	6	25
Sprint 7	2026-01-11 — 2026-01-24	Continuación del desarrollo de la aplicación móvil.	4	9
Sprint 8	2026-01-25 — 2026-02-07	Grandes avances en desarrollo de aplicación móvil + Figma de la misma.	6	12
Sprint 9	2026-02-08 — 2026-02-21	Migración de la web a Angular SSR, mejoras de seguridad y SEO con pruebas ZAP y	8	22
Sprint 10	2026-02-22 — 2026-03-07	Angular CSR completamente aplicado y mejoras varias + aplicación móvil funcional	12	35
Sprint 11	2026-03-08 — 2026-03-21	Consolidación del chat con IA en web y Android, recuperación de WorkerManager, o	13	24
Sprint 12	2026-03-22 — 2026-04-04	Estabilización de la integración del chat con IA tras la rotación de API keys de	1	1
Sprint 13	2026-04-05 — 2026-04-18	Integración y mejora del flujo de pago web con Stripe, ajustes visuales e intern	7	11
Sprint 14	2026-04-19 — 2026-05-02	Mejoras integrales en experiencia web, autenticación social, estabilización de d	9	18

Sprint 15	2026-05-03 — 2026-05-16	Regularización integral de Jira, continuidad de mejoras y adiciones extra en la	13	34
Sprint 16	2026-05-18 — 2026-05-30	Últimas implementaciones y mejoras + Finalización del desarrollo de app Android.	9	27
Sprint 17	2026-06-02 — 2026-06-04	Desarrollo de la documentación final del proyecto intermodular y preparación de	2	10

Los sprints 1–17 cubren desde la infraestructura inicial hasta la entrega TFG y cierre del producto.

Sprint 17 — exposición y entrega TFG


Iteración acotada (2–4 jun 2026) alineada con la defensa del TFG; equivalente al «sprint de exposición» de otros proyectos. Detalle ADF, subtareas y checklists en [Sprint 17](#).

Clave	Resumen	SP	Estado	Asignado
PI-902	US-89: Crear presentación final del TFG	5	Finalizada	Rosario González
PI-943	US-88: Documentación final integrada para entrega y presentación del TFG	5	Finalizada	Álvaro Jiménez


2 US/TASK, 4 subtareas, 10 SP — 100% finalizadas.

7. Tablero, backlog y burndown


La gestión visual se realiza en el tablero Scrum y el backlog del proyecto PI. Burndown y reportes por sprint están disponibles en Jira (Informes del sprint).

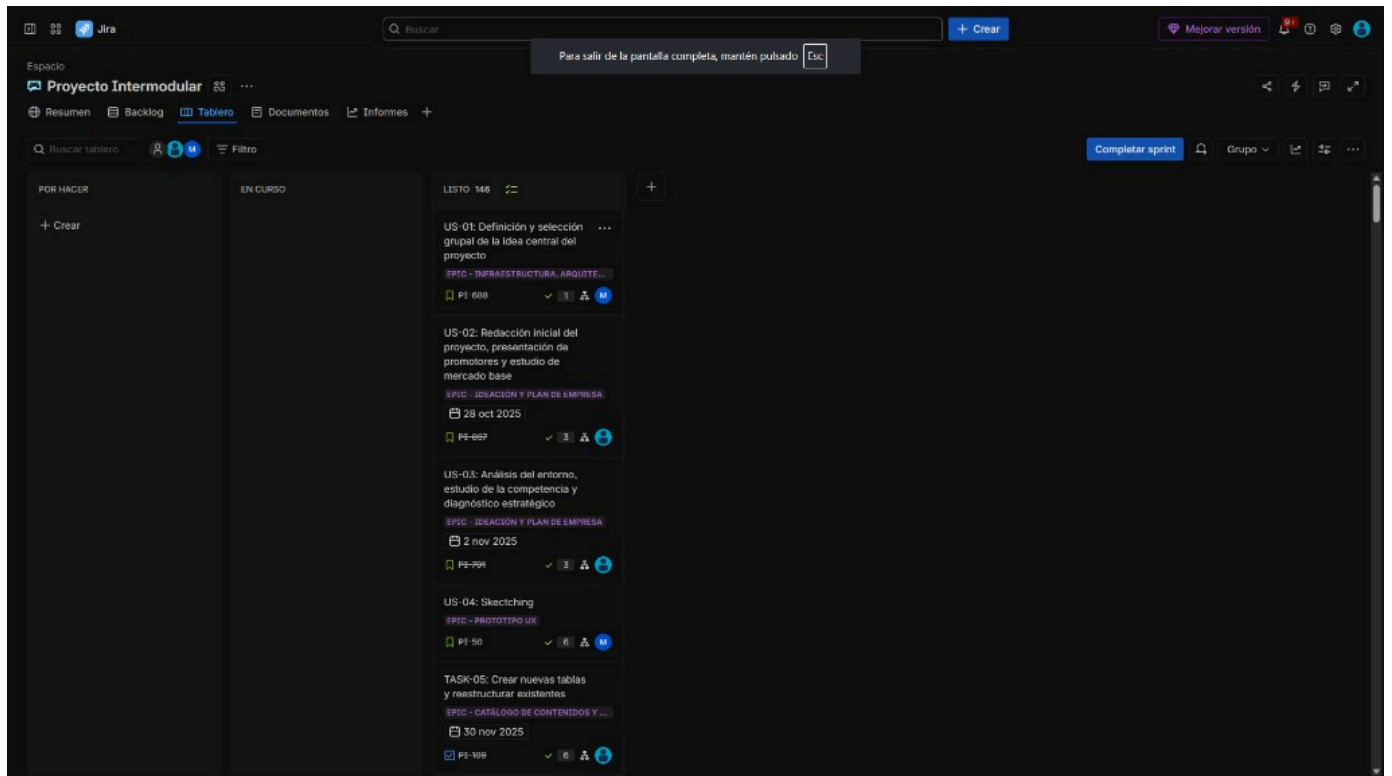

Tablero Scrum del proyecto **PI**: columnas Por hacer, En curso y Finalizada.

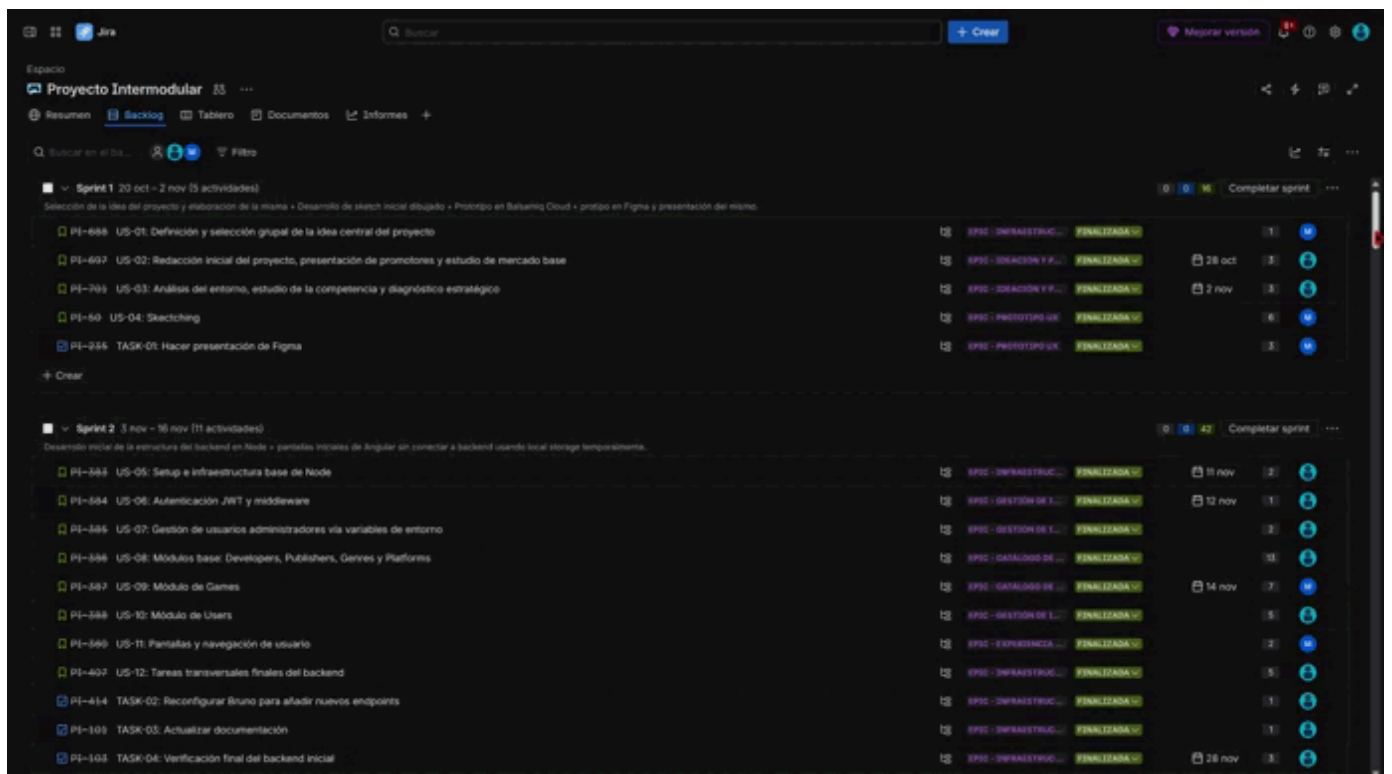

Recorrido del **backlog** (GIF): sprints 1–17 y panel de epics; incidencias en estado *Finalizada*.

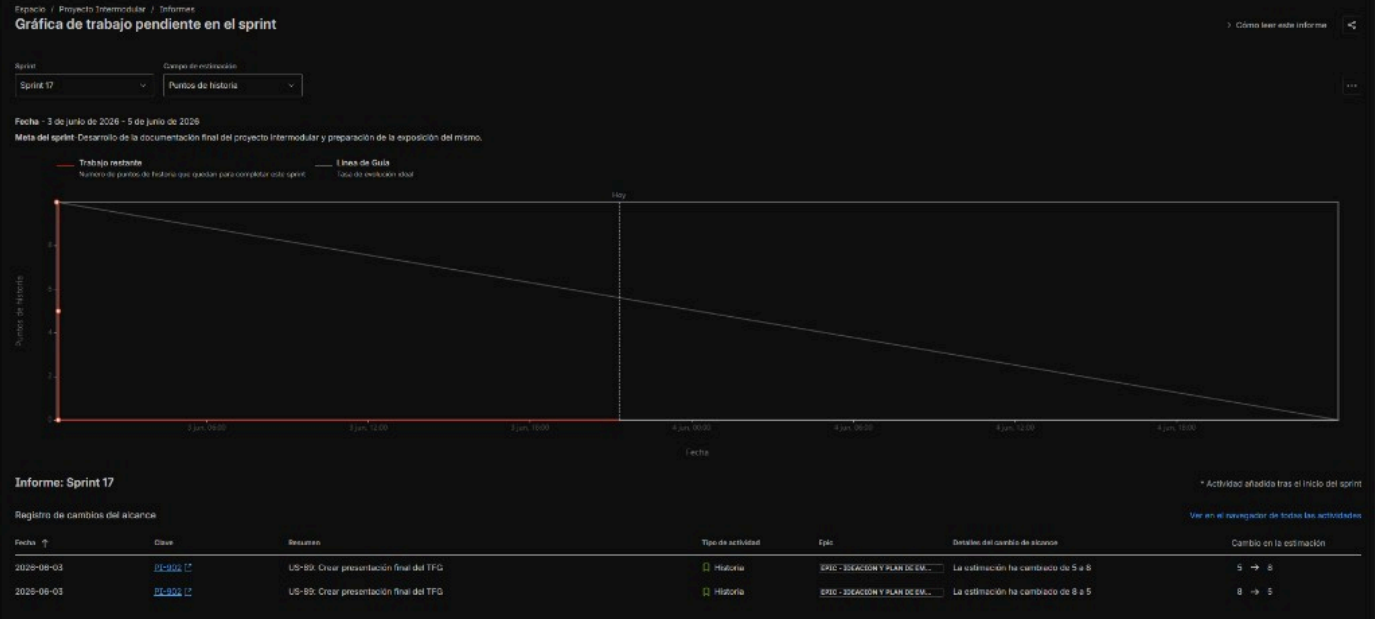

Burndown del **Sprint 12** (23 mar – 5 abr 2026), desde Informes del sprint en Jira.

 Sin epic

>  EPIC - IDEACIÓN Y
PLAN DE EMPRESA ...

>  EPIC - Prototipo UX ...

>  EPIC -
INFRAESTRUCTURA,
ARQUITECTURA Y ...
DEVOPS

 EPIC - GESTIÓN DE


>  EPIC - GESTIÓN DE
IDENTIDAD Y
SEGURIDAD ...

>  EPIC - CATÁLOGO DE
CONTENIDOS Y
PRODUCTOS ...

>  EPIC - EXPERIENCIA
WEB Y E-COMMERCE ...

>  EPIC - DESARROLLO
DE APLIACIÓN
NATIVA MÓVIL ...

>  EPIC - SEGURIDAD

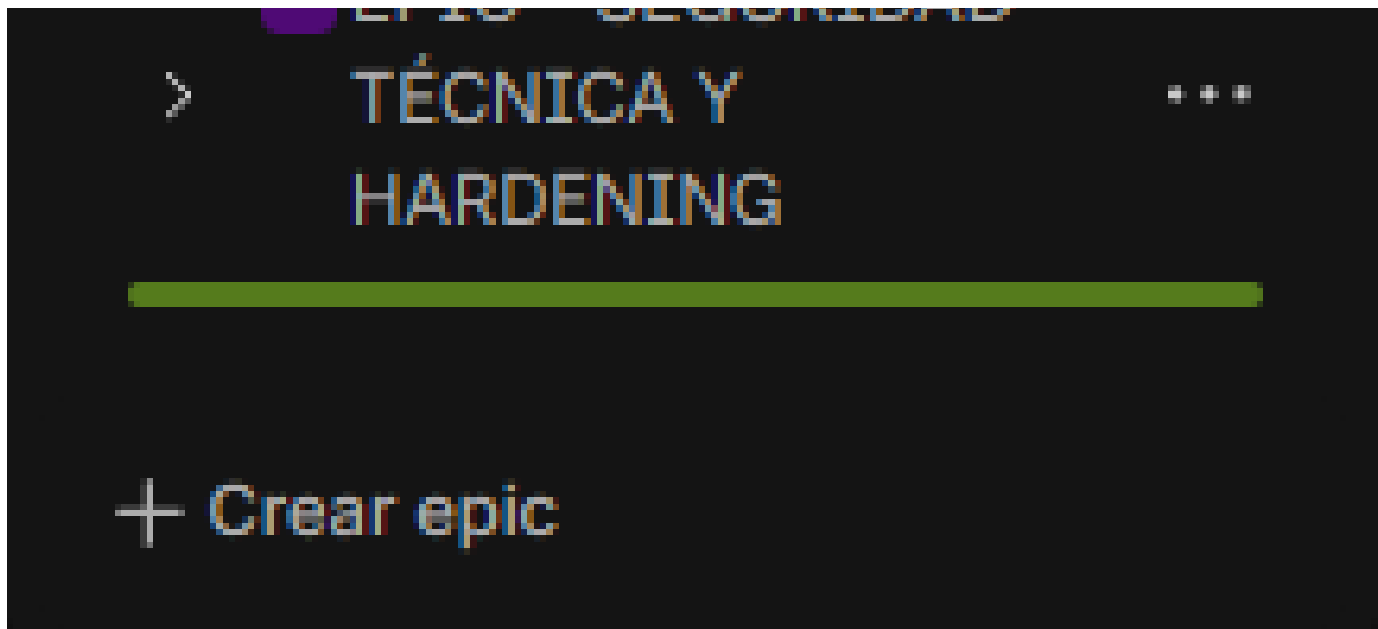

Backlog con panel de **epics** (8 epics del proyecto PI).

8. Coherencia backlog ↔ producto

- Epics abiertos en la UI de Jira, pero **los 8 epics están terminados**; sprints abiertos para observación, **cerrados en la práctica al superar su fecha de fin**.
- Tickets en estado *Finalizada* alineados con funcionalidades desplegadas en GameSage (SSR, API, móvil, BI según epic).
- Sprints 15–17 reflejan cierre de producto, i18n, auditoría y entregables TFG.
- Trazabilidad: cada US/TASK enlazada a epic padre y sprint; subtareas bajo su padre en la documentación de sprint.

9. Detalle ampliado

Para el desglose por epic, sprint y equipo:

- [Introducción y acceso](#) — convenciones y mapa
- [Epics del proyecto](#) — descripción completa de cada epic
- [Histórico de sprints](#) — cada US/TASK y subtareas
- [Equipo, métricas y vista del backlog](#) — estadísticas y capturas de backlog

Enlaces de referencia

- [Tablero Scrum PI](#)
- [Backlog PI](#)
- [Repositorio GitHub \(monorepo\)](#)
- [Espacio Confluence PI](#)
- [Visión general del proyecto](#)
